


No.・区分	Z1503	ソフト部門
タイトル	ダンプトラック積載標準図	
動機・改善前の状況	造成工事において、ダンプトラックによる場外への残土搬出を行う場合、積込量をバックホウオペレーターの経験に頼っていたため、積込量が一定せず過積載の状態で搬出する場合があった。	
改善・実施事項	定期的にポータブルトラックスケールにより積載荷重を管理するとともに、標準荷姿とバケット積込回数を定め、図式化したものをオペレーターに渡し積込量のバラツキをなくすようにした。	
改善効果	土質等の変化にもその都度対応でき、オペレーターが変わっても個人差がでないようになった。また、ダンプトラック運転手からの過積載のクレームも減少した。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!

ダンプ積載標準図

標準荷姿写真




積載重量： 8.62 t



積載重量： 8.64 t

標準荷姿図

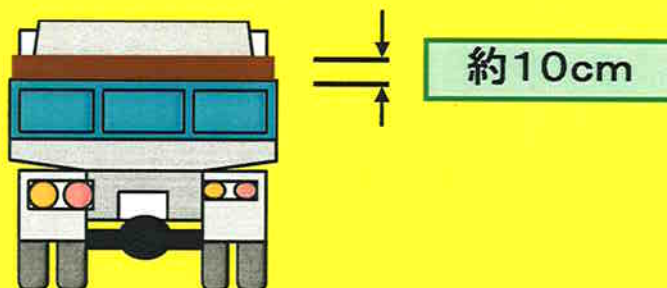

標準積込回数

1.4m3級BH : 3回

